

Démantèlement de Chertal
Comité d'accompagnement

12 septembre 2022- Château d'Oupeye

19H00 Introduction et approbation du PV du Comité du 10 mars 2022

19H10 Présentations SDC

État d'avancement des travaux

Planning et perspectives

Retour sur les interactions des riverains via la plateforme

20H00 Echanges riverains

21H30 Fin



Présentations SDC


Comité d'accompagnement




1. État d'avancement des travaux

Rappel

- Phasage du démantèlement

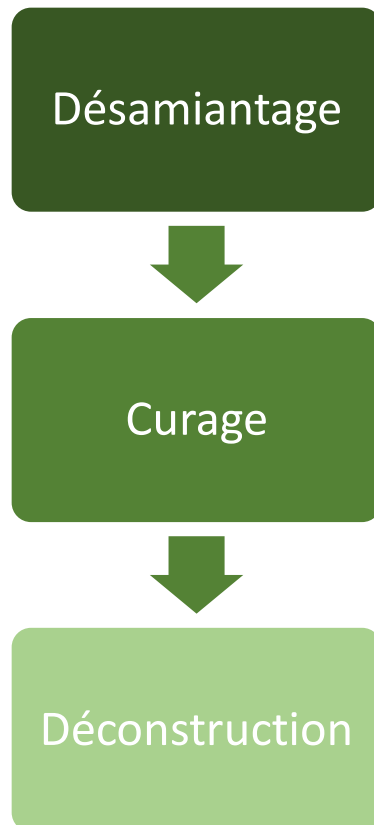

- Orientation des co-produits et déchets



Vidéo

- https://www.youtube.com/watch?v=yKV8thZN-9U&ab_channel=STSaon



Laminoir

- Désamiantage
 - La majorité des éléments enlevée et évacuée
 - Aucun dépassement des normes en vigueur
 - Inventaire + 120 échantillons
 - 25% des échantillons positifs => traitement sécurisé
 - Curage
 - Revalorisation
 - Toitures en hydrocarbures (40 tonnes) – 75% évacuées
 - Lots de plastiques haute qualité (HPDE, PVC...) constitués
 - 70% autres déchets à valoriser (203 tonnes de bois industriel, 38 tonnes de papier-cartons, 48 tonnes de déchets électriques et électroniques (DEEE))
 - Centres de recyclage
 - Moins de 1% des déchets
- => Taux de recyclage : 98%



Laminoir

- Démantèlement => au ralenti en été, relance mi-août
- Nombreuses toitures enlevées
- Colonnes de soutien progressivement découpées



Aciérie

- Désamiantage
 - Travaux toujours en cours
 - Quelques travaux dans des zones isolées à prévoir pendant le 4em trimestre



Aciérie

- Curage – en cours
 - Bois, plastiques, papier-cartons
 - Nettoyage des zones autour des installations et débroussaillage des plantes invasives
 - Evacuation des déchets au sol
 - Nettoyage des poussières dans la zone des convertisseurs



Aciérie

- Démantèlement
 - Quelques bardages enlevés pour apport de lumière sur le chantier
 - Aucune autre opération pour l'instant



Autres

- Sécurité
 - Contrôle des clôtures et accès reste une priorité
- Valorisation mitrailles
 - Deux péniches évacuées
 - Une 3^{ème} prévue en septembre



2. Planning et perspectives

2.5. Premiers travaux (TLB)

		Semaines																2023																																		
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21													
		Septembre				Octobre				Novembre				Décembre				Janvier				Février				Mars				Avril				Mai																		
Désamiantage	24																																																			
Curage	0																																																			
Nettoyage	8																																																			
Démontage hall salles de machines	4																																																			
Démontage hall sousstation	3																																																			
Démontage batiments autour du TLB	12																																																			
Démontage hall compresseurs	7																																																			
Démontage hall	8																																																			
Démontage ligne TLB	26																																																			

2.5. Premiers travaux (Aciérie)

	Semaines	2023																																					
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Septembre				Octobre				Novembre				Décembre				Janvier				Février				Mars				Avril				Mai					
Désamiantage	10																																						
Curage	9																																						
Nettoyage	4																																						
Nettoyage mitrailles par terre	17																																						
Demontage structures et installations à l'interieur	38																																						
Démontage bâtiments autour ACC	21																																						
Démontage toitures ACC	13																																						

3. Retour sur les interactions des riverains via la plateforme

Rappel



- Contact chantier

- Numéro accessible de 9 à 16 H
- Boite mail
- En dehors des heures

0476 302650

contact@sdchertal.be

Répondeur et numéro d'urgence


- Plateforme Internet

- www.sdchertal.be

- Personnes de contact

- Jacques Roland - Assistant du gestionnaire chantier
- Sabine Huc – Communication
- Kris Martens – Directeur Général
- Ir. Karel Lambie – Adjoint au Directeur Général

Contacts riverains

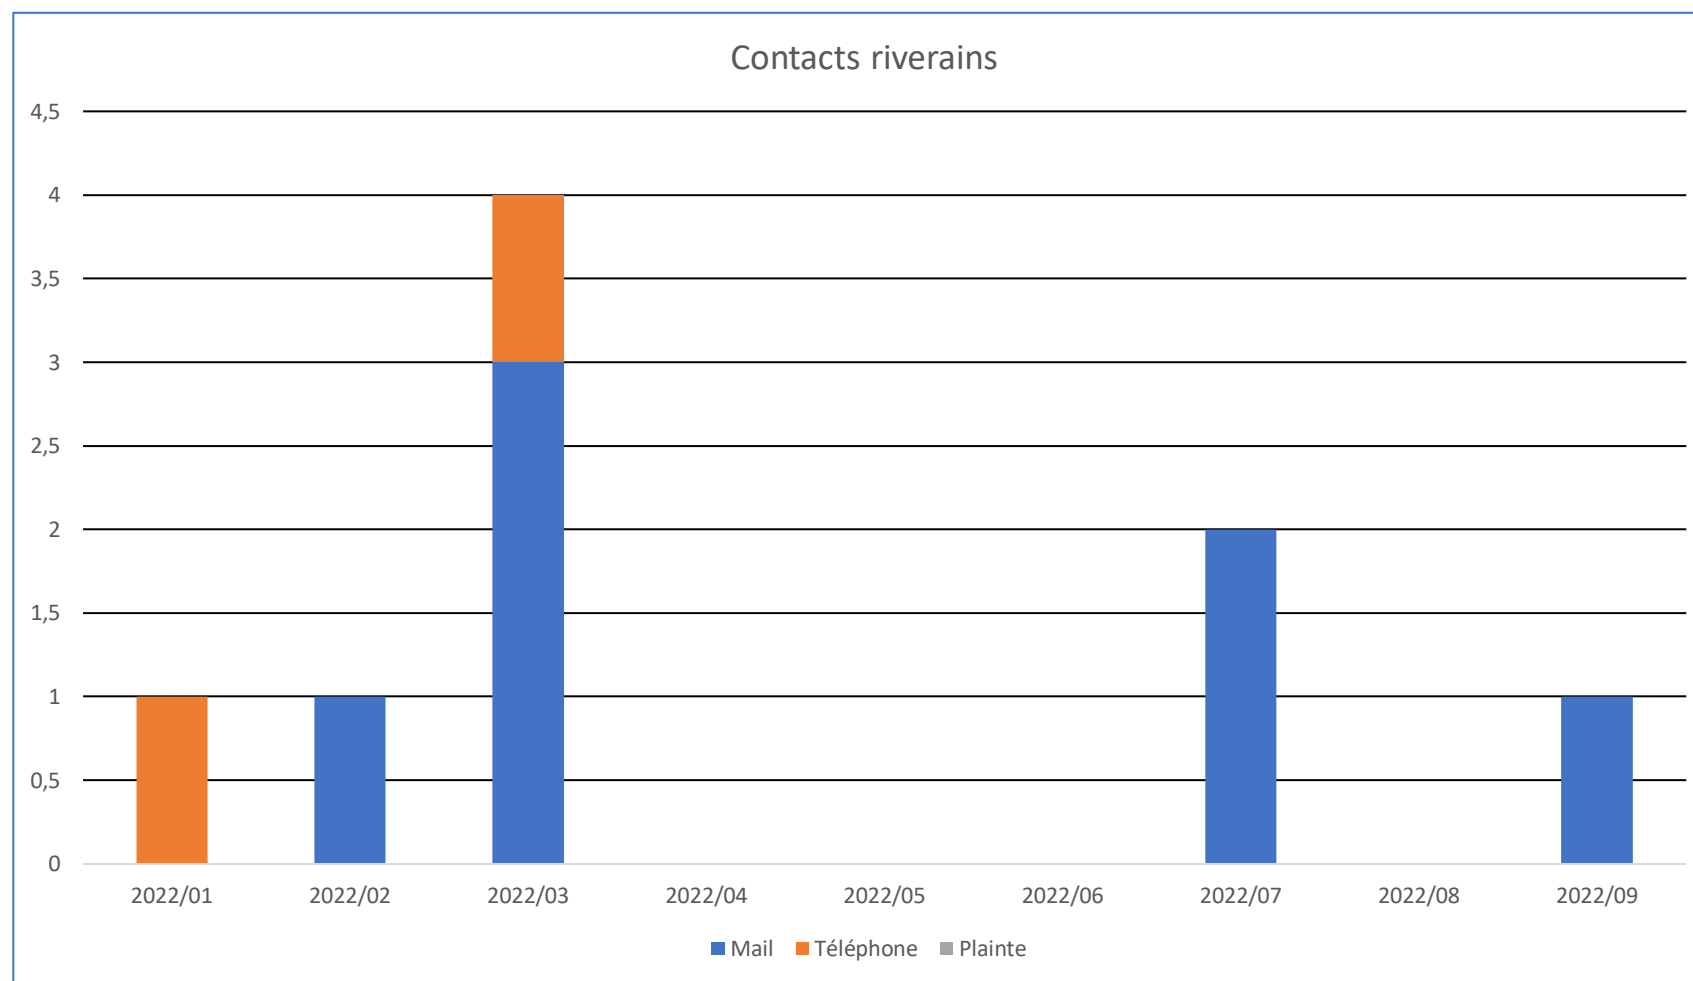

- 7 mails – 100% réglés
 - Personnel Chertal déçus
 - Demande de visite/reportage
 - Renseignement sur régime de vacances
 - Bruit ponctuel
- 2 appels téléphoniques
 - Exercice défense
 - Odeurs
- Plainte
 - Sans objet

Publiées sur la plateforme

- Bilan début mai 2022 (3 news)
 1. Semi-marathon de Liège le 16 octobre passera sur le site de Chertal
 2. Evacuation des mitrailles, chargement de la première péniche
 3. Evacuation des boues d'aciérie vers le site de la Chatqueue à Ougrée
- A publier : bilan août 2022

L'actualité



Evacuation des boues d'aciérie vers le site de la Chatqueue à Ougrée
A partir du lundi 8 août, et ce pour une [...]



Evacuation des mitrailles, chargement de la première péniche (mise à jour)
Mercredi 29 juin, SDC procédera au chargement de la première [...]



Semi-marathon de Liège 2022
Semi-marathon de Liège La troisième édition du semi-marathon de la [...]



Merci pour votre attention

Information riverains

www.sdchertal.be

contact@sdchertal.be

+32 (0) 476 30 26 50

(accessible de 9 à 16 heures)



19H00 Introduction et approbation du PV du Comité du 10 mars 2022

19H10 Présentations SDC

État d'avancement des travaux et planning

Mesures d'air dans l'environnement

Retour sur les interactions des riverains via la plateforme

20H00 Echanges riverains

21H30 Fin

Démantèlement de Chertal
Comité d'accompagnement

12 septembre 2022- Château d'Oupeye
