

# Démantèlement du site de Chertal Comité d'accompagnement

Le 29 mars 2023



- 18H30 Introduction et approbation du PV du Comité du 12 septembre 2022
- 18H40 Présentations SDC (Kris Martens)
  - État d'avancement des travaux et planning
  - Retour sur les interactions des riverains via la plateforme
- 19H10 Présentation Commandement militaire Province de Liège (Marc Franck)
  - Intérêt et dispositions prises lors de l'organisation d'exercices militaires sur le site de Chertal
- 19H30 Présentation ISSEP (G. Gérard)
  - Surveillance de la qualité de l'air dans l'environnement
- 20H00 Echanges riverains
- 20H30 Fin



Comité d'accompagnement  
29 mars – Kris Martens




# 1. État d'avancement des travaux

=> plus de 100 bâtiments démantelés

# Rappel

- Phasage du démantèlement

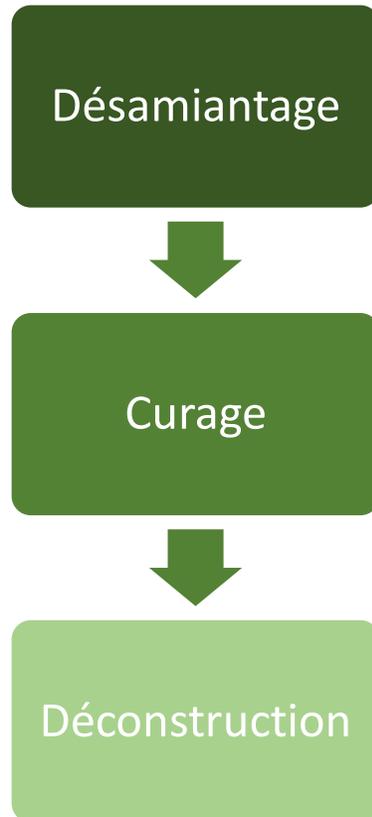

- Orientation des co-produits et déchets



# Vidéos (séquences à télécharger)

















# Laminoir

## 90% des déchets curés et triés


- Désamiantage
  - La majorité des éléments enlevée et évacuée
  - Aucun dépassement des normes en vigueur
  - Inventaire + 160 échantillons
  - 15% des échantillons positifs => traitement sécurisé
- Curage
  - Revalorisation
    - 75% des toitures en hydrocarbures (45 tonnes)
    - Lots de plastiques haute qualité (HPDE, PVC...) constitués
    - 70% des autres déchets
      - 299 tonnes de bois industriel
      - 38 tonnes de papier-cartons
      - 62 tonnes de déchets électriques et électroniques (DEEE)
  - Centres de recyclage
    - Moins de 1% des déchets

=> Taux de recyclage : 98%




# Laminoir

- Déconstruction
  - La plupart des toitures enlevées
  - Colonnes de soutien progressivement découpées
  - L'ensemble des halls seront démantelés fin d'année (à l'exception du hall principal)

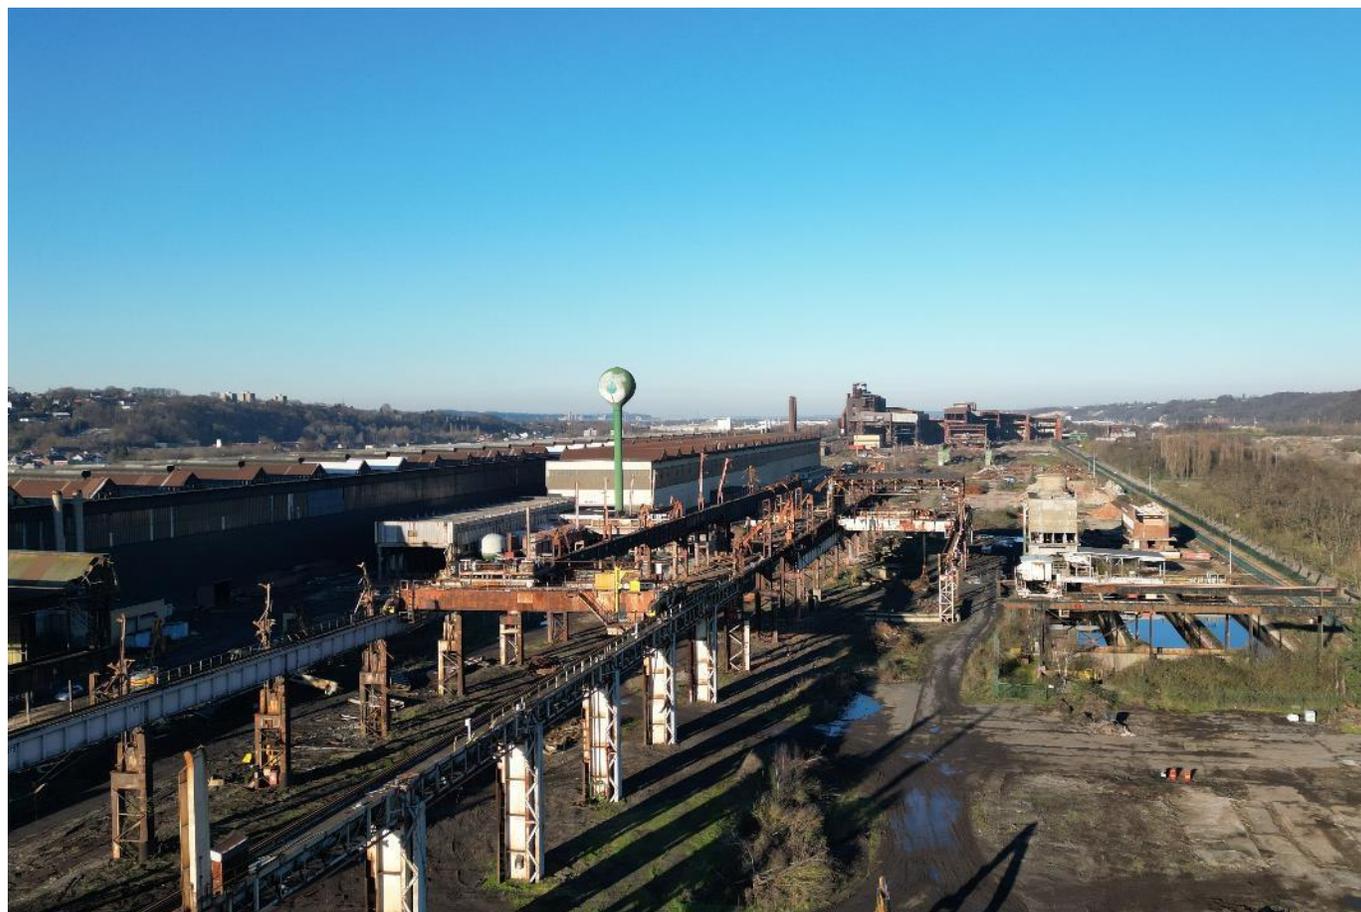


# Aciérie

- Désamiantage
  - Réalisé à 95%
  - Quelques interventions à réaliser dans des zones isolées (1<sup>er</sup> trimestre)
  - Aucun dépassement des normes
  - 40 échantillons additionnels à l'inventaire de l'ISSEP

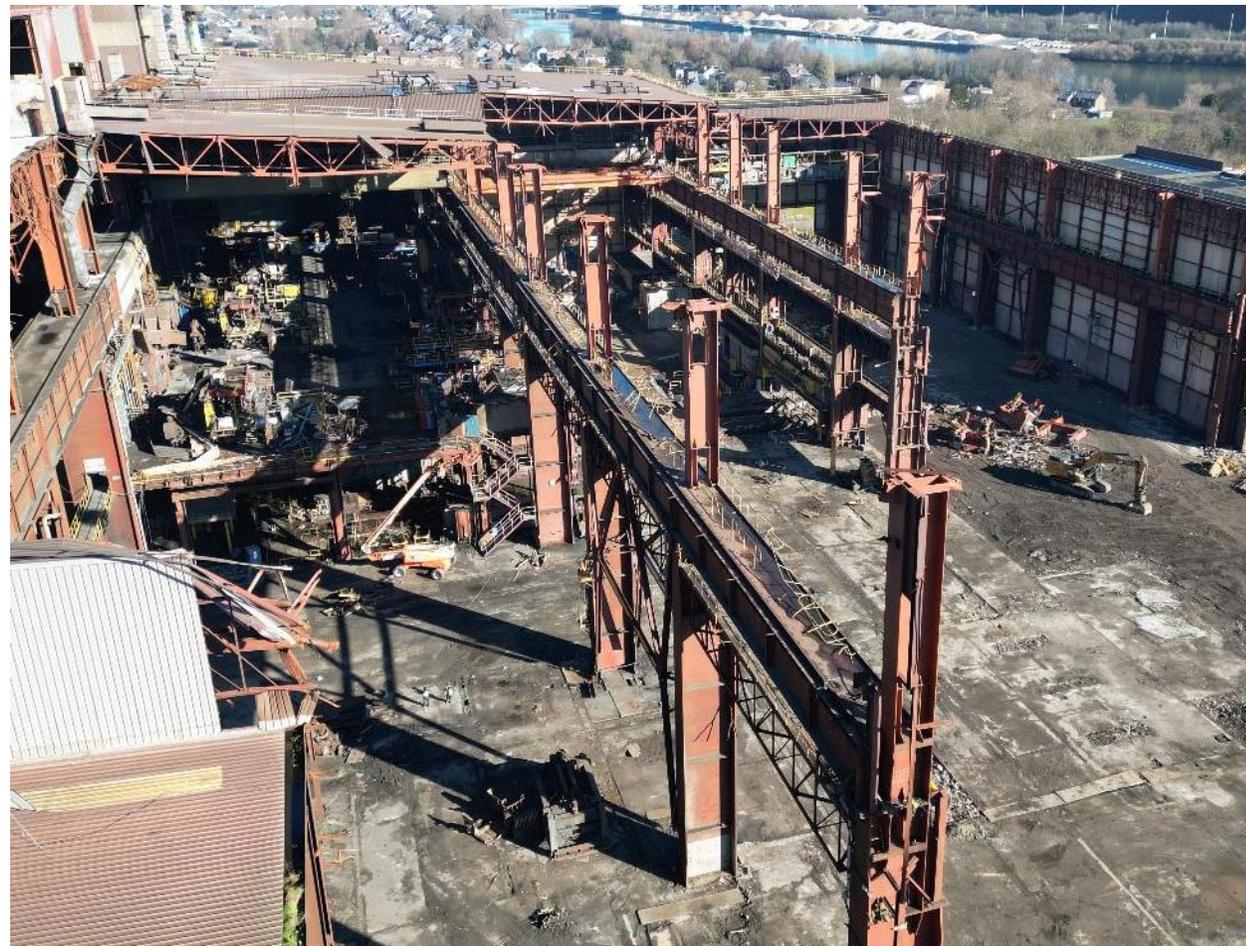


# Aciérie

- Curage – en cours
  - Bois, plastiques, papier-cartons
  - Nettoyage des zones autour des installations et débroussaillage des plantes invasives
  - Evacuation des déchets au sol
  - Nettoyage des poussières 90% réalisé

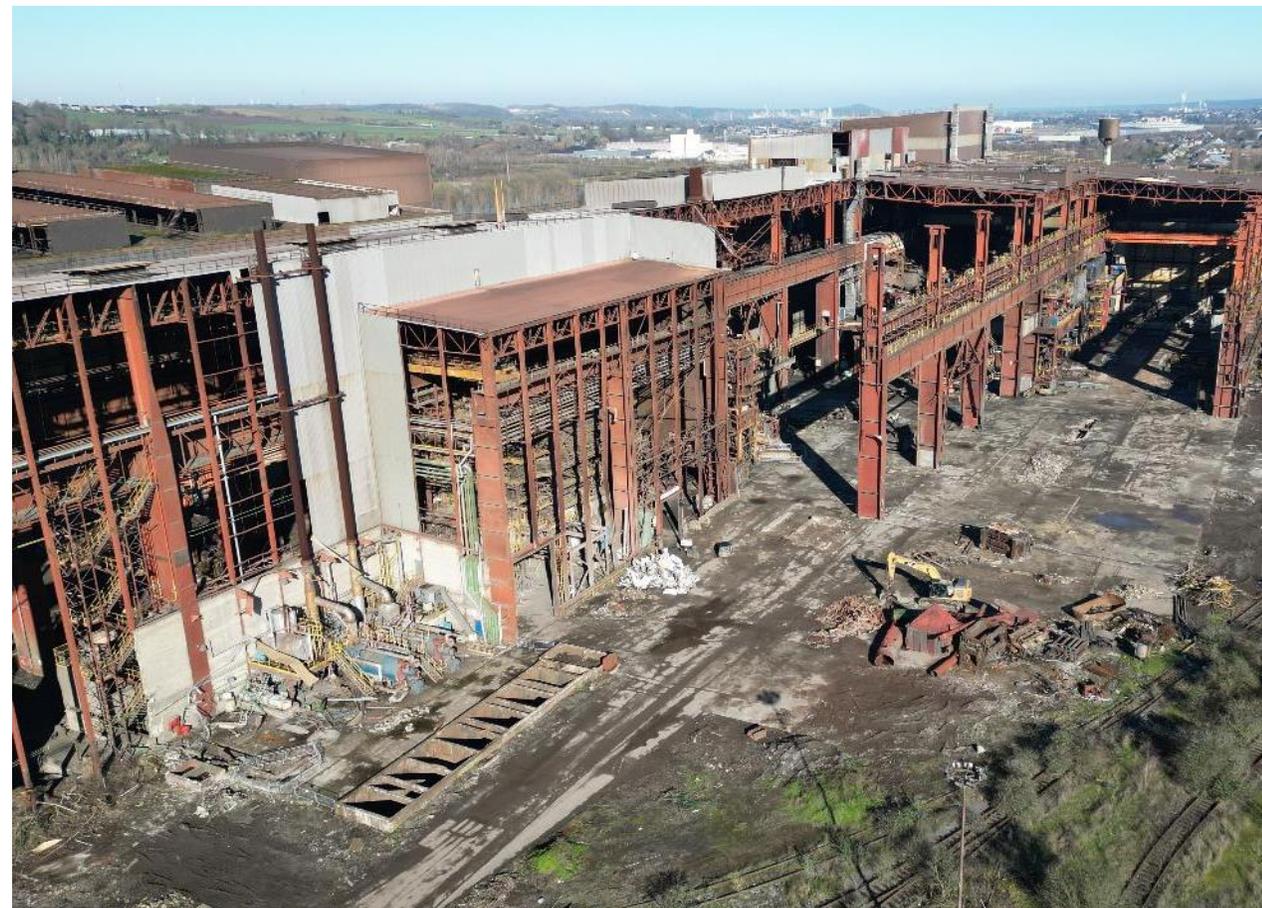

# Aciérie

- Démantèlement
  - Nombreuses toitures enlevées
  - Une partie des bâtiments reste en place (protection riverains)
  - Abattage des grosses structures prévu 2em trimestre

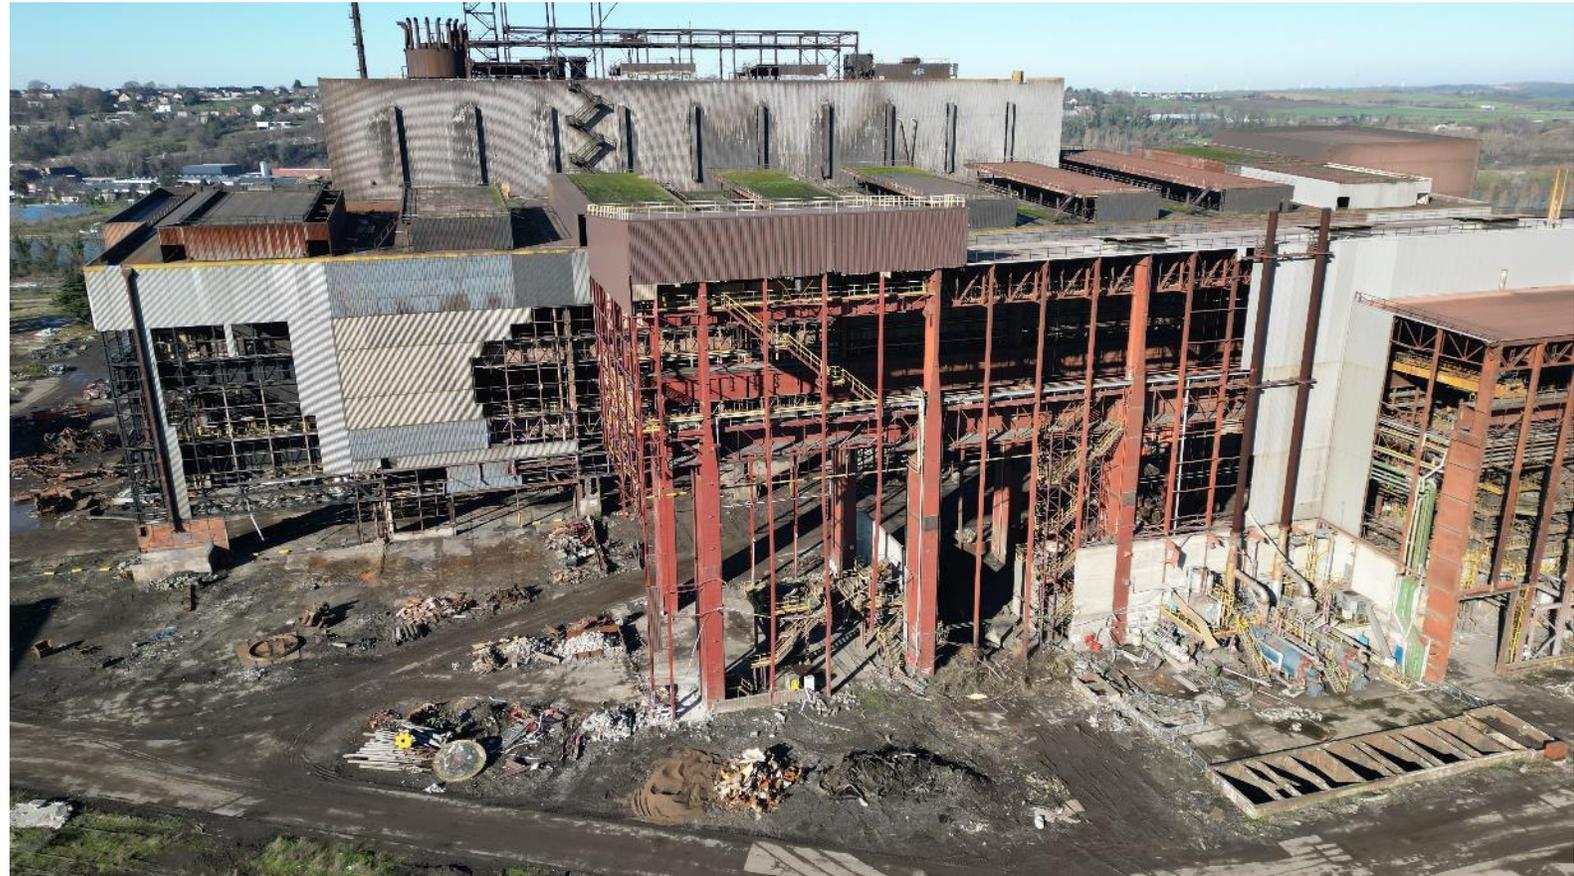

# Autres

- Sécurité
  - Contrôle des clôtures et accès reste une priorité
- Valorisation mitrailles
  - 8 péniches évacuées au total vers ArcelorMittal



## 2. Planning et perspectives

# Partie TLB

Chertal - partie TLB	Semaines																																																																
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																				
		Mars			Avril				Mai				June				Juillet				Aout				Septembre				Octobre				Novembre				Decembre																												
Désamiantage	6	■																																																															
Curage	2											■																																																					
Nettoyage produits hydrauliques	18	■																																																															
Démontage batiments autour du TLB	0																																																																
Démontage hall compresseurs	6							■																																																									
Démontage des halls et structures	12							■		■				■																																																			
Démontage ligne TLB	15																							■												■				■																									
Demontage hall TLB	XX																																									■				■																			



### 3. Retour sur les interactions des riverains via la plateforme

# Rappel



- Contact chantier

- Numéro accessible de 9 à 16 H
- Boite mail
- En dehors des heures

0476 302650

contact@sdchertal.be

Répondeur et numéro d'urgence


- Plateforme Internet

- [www.sdchertal.be](http://www.sdchertal.be)

- Personnes de contact

- Jacques Roland - Assistant du gestionnaire chantier
- Sabine Huc – Communication
- Kris Martens – Directeur Général
- Ir. Karel Lambie – Adjoint au Directeur Général

# Contacts riverains

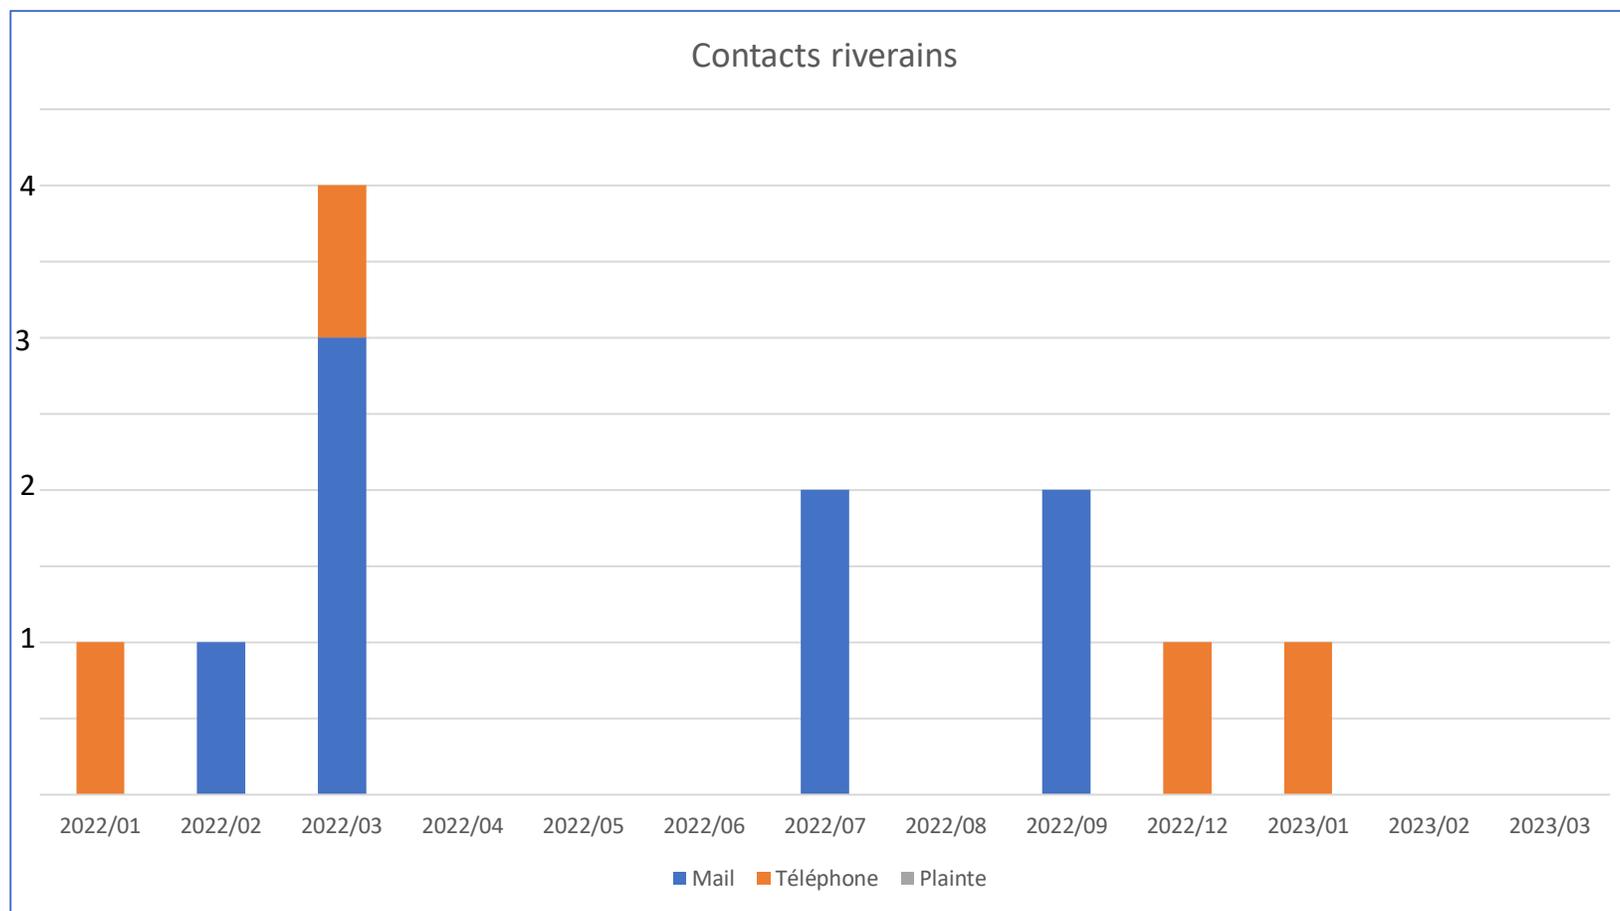


13 mois de mesure

- 8 mails – 100% réglés
  - Personnel Chertal déçus
  - Demande de visite/reportage
  - Renseignement sur régime de vacances
  - Bruit ponctuel
- 4 appels téléphoniques
  - Exercice défense
  - Odeurs
  - Chargement bateau
- Plainte
  - Sans objet

# Publiées sur la plateforme

- Bilan 6 mois (3 news)
- Exercice militaire 28 septembre (Génie Amay)
- Semi-marathon de liège le 16 octobre
- Exercice militaire 9 février (formation technique)
- Bilan 1 an (3 news)
- Exercice militaire 24-26 février

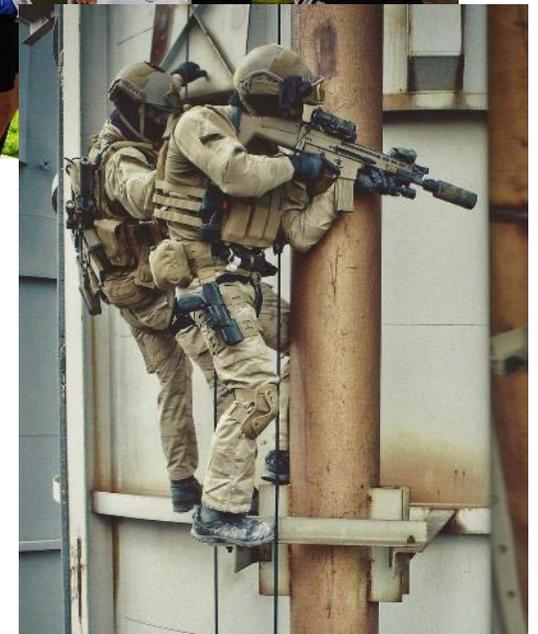



Merci pour votre  
attention

Information riverains

[www.sdchertal.be](http://www.sdchertal.be)

[contact@sdchertal.be](mailto:contact@sdchertal.be)

+32 (0) 476 30 26 50

(accessible de 9 à 16 heures)

