

Démantèlement du site de Chertal Comité d'accompagnement

Le 13 mai 2025



Ordre du jour

18H00 Approbation du pv de la dernière réunion

18H05 État d'avancement des travaux

18H20 Rapportage des plaintes/remarques (quid des exercices militaires ?)

18H30 Perspectives sur les années à venir

18H40 Divers



Etat d'avancement des travaux
13 mai 2025




Rappel




- Caractéristiques
 - 4 ans
 - 300 bâtiments répertoriés
 - 60 emplois
 - Organisation du chantier en fonction de nombreux critères aléatoires
 - La présence ou non d'amiante
 - Le type d'engin de chantier à utiliser
 - Les conditions atmosphériques
- ➔ Communication anticipative vers les autorités et les riverains

Rappel

- Phasage du démantèlement

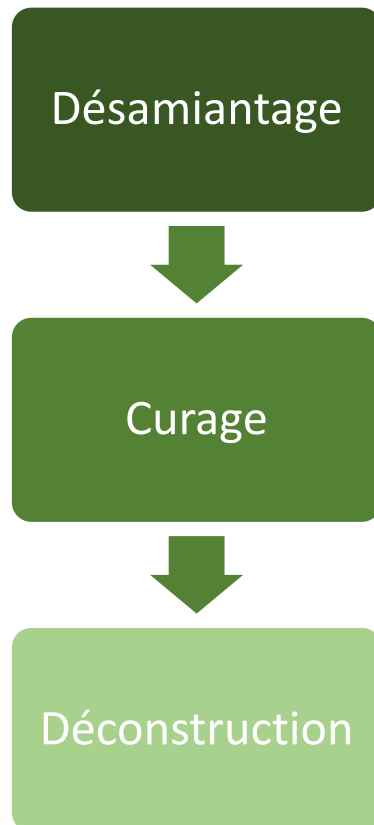

- Orientation des co-produits et déchets



État d'avancement: partie TLB



En cours :

- Finisseur retiré et découpé
- Dégrossisseur en cour et bientôt terminé (chassis)
- Cave côté four jusqu'au bout du TLB en cours
- Démolition des installations des caves des fours à slabs terminée. Nettoyage en cours
- Nettoyage de la dalle (niveau 0) du TLB en cours
- Démolition du hall des expéditions en cours (retrait de la toiture)

État d'avancement: partie TLB



A venir :

- Cave sous le TLB vide. En attentes du nettoyage d'ArcelorMittal
- Nettoyage de la fosse de la salle des machines en attentes
- Zone TLB fosse à paille : Pompage et séparation huile-eau
- Retrait des ponts roulant et chemins de roulement

Situation janvier 2022



État d'avancement: partie TLB



État d'avancement: partie ACC



En cours :

- Préservation du bâtiment F24 pour la zone de découpe au chalumeau
- Préparation des zones G07 et G08 pour affalement : découpage des grosses pièces, déblayement, cisaillement de poutrelles. Affalement prévu pour fin d'année 2025
- Affalement aciérie terminé. Préparation de la coulée continue (G7 G8)

État d'avancement: partie ACC




G07 G08

Zone Découpe

État d'avancement: partie ACC

ACC: AFFALEMENT PARTIE 5

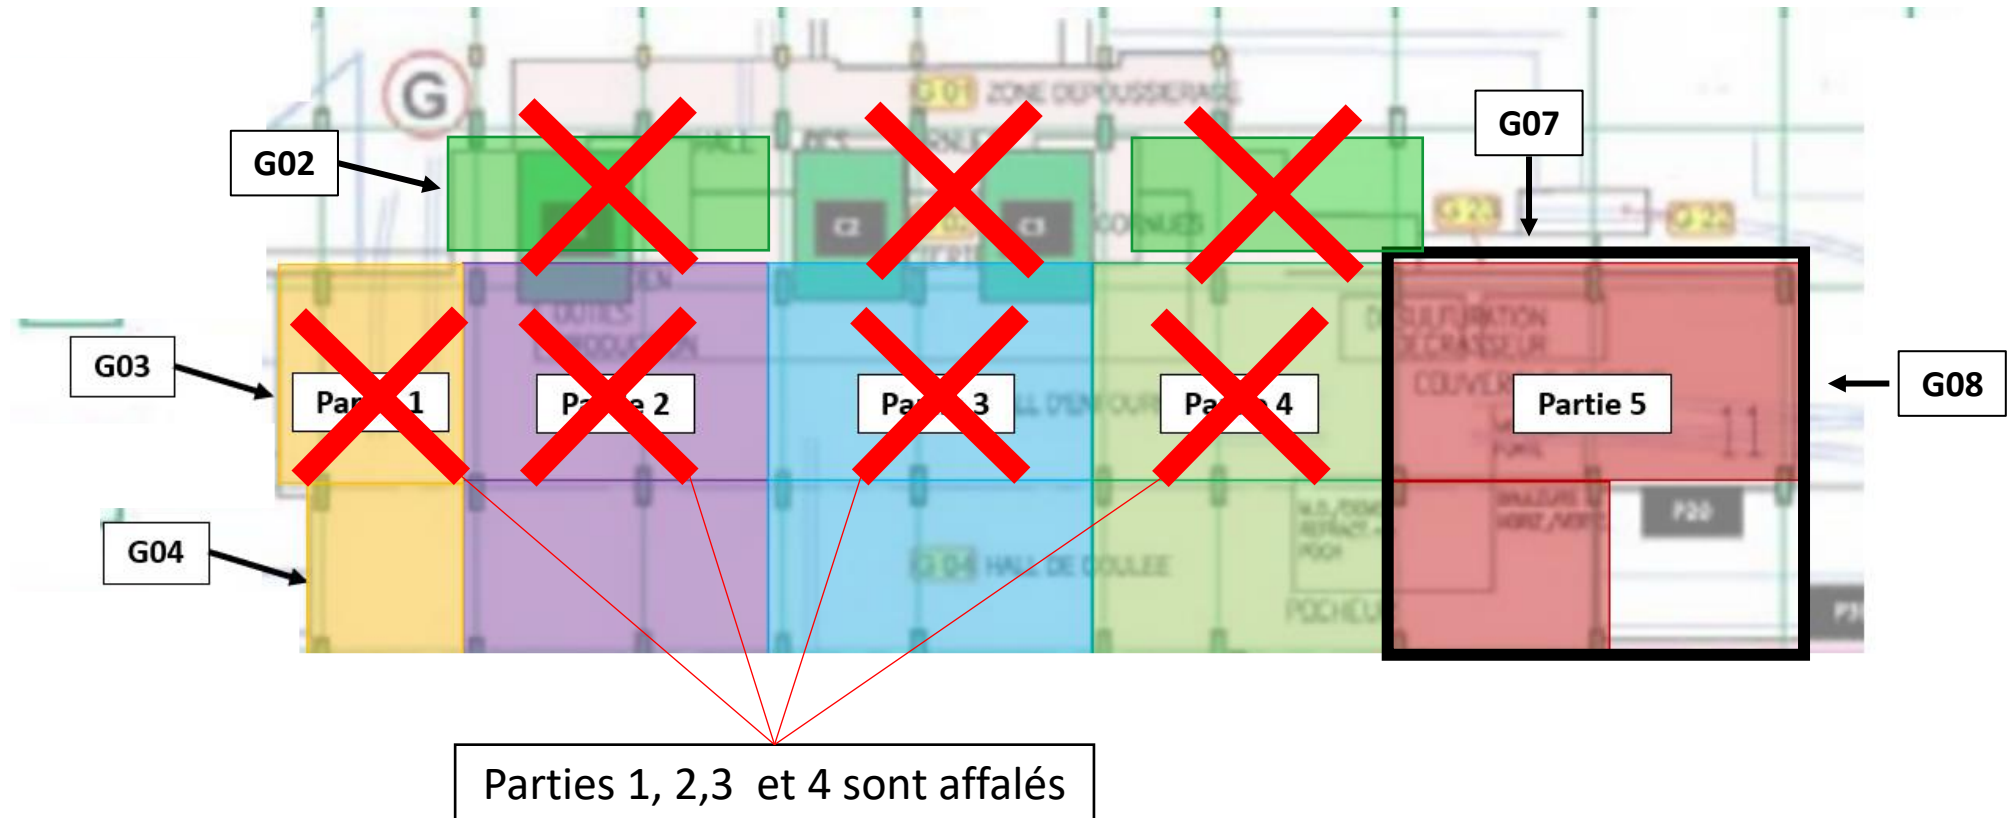


Plan de surveillance




Rapport sur date incluant les nouvelles données reçu 17 janvier 2025. Norme sur la qualité de l'air respectées.

Déchets: autre que métaux

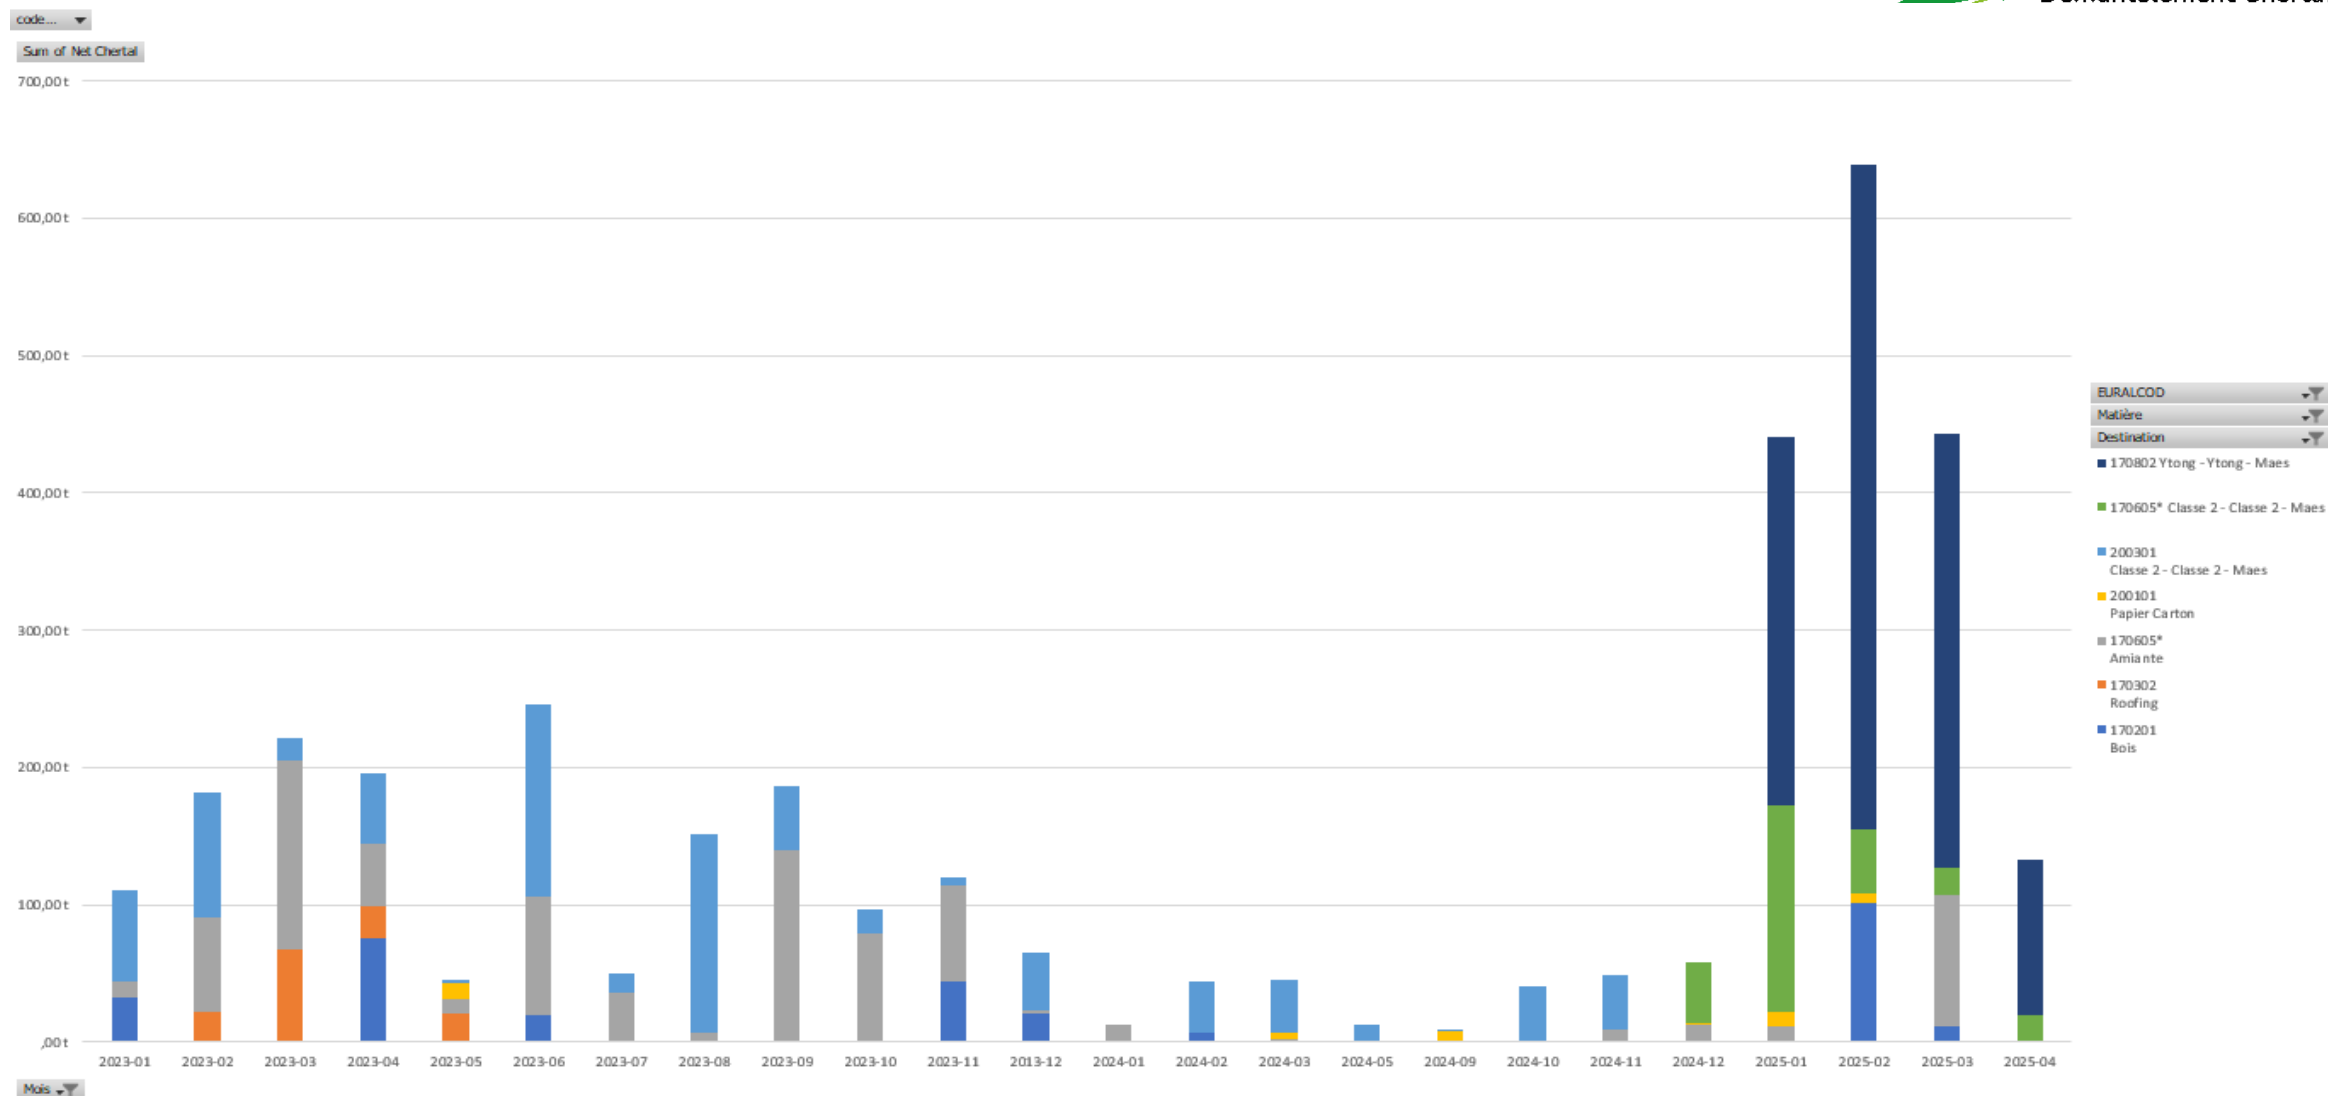

Déchets: Fer

- Aperçu jusqu'à février 2025:

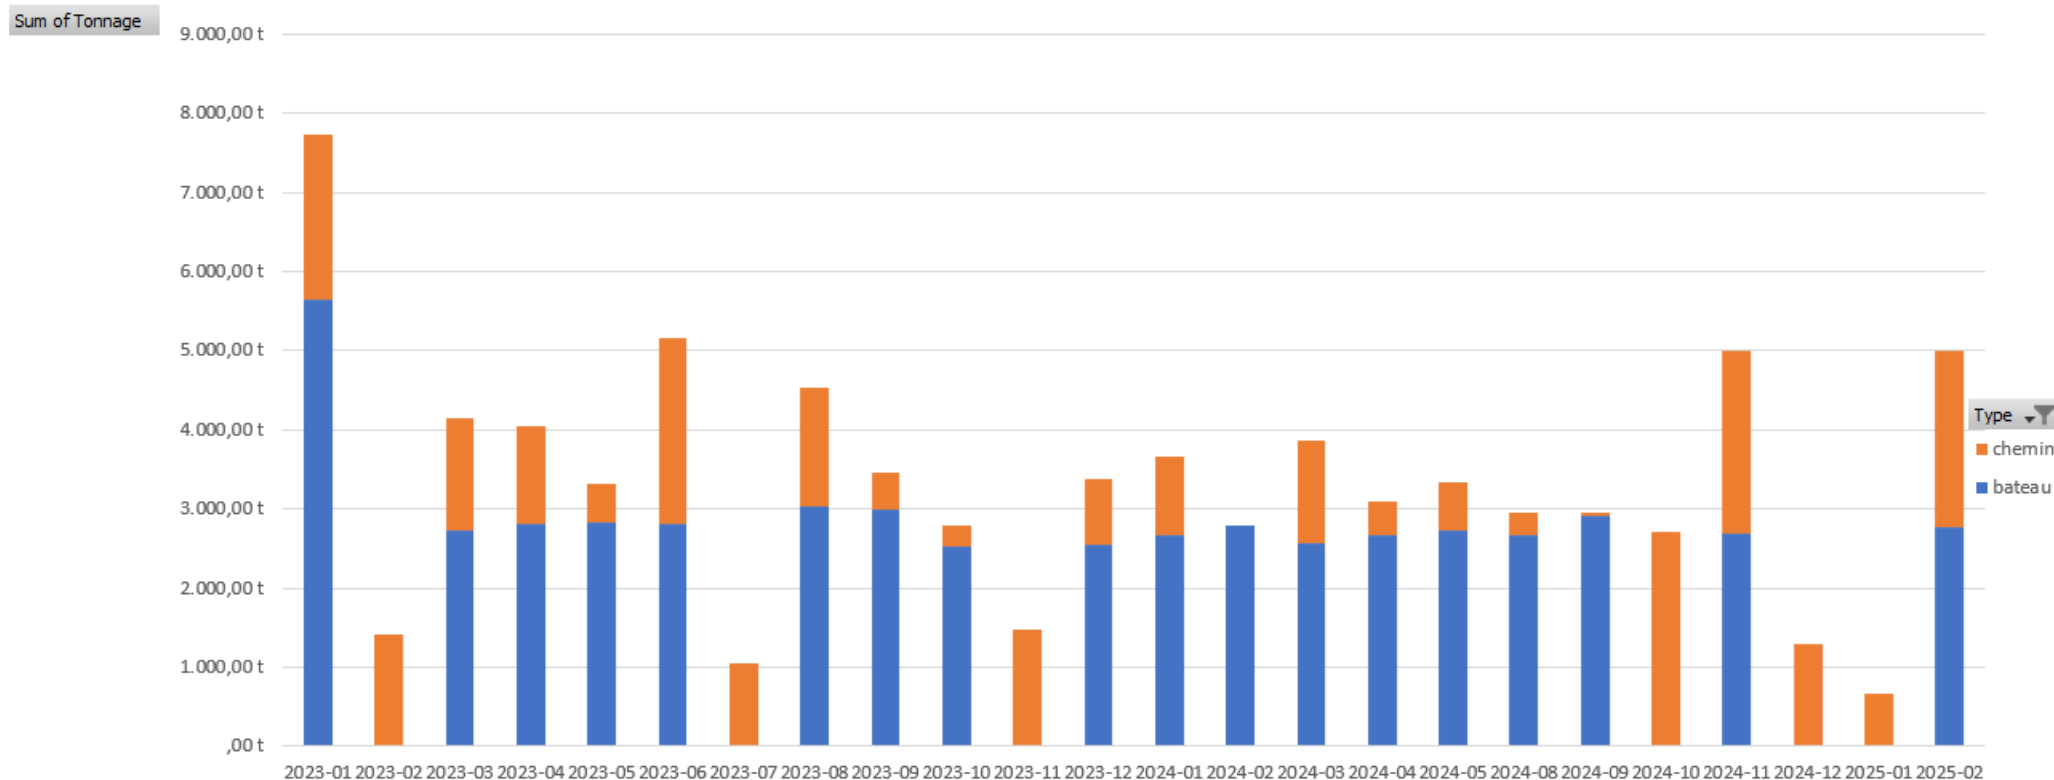

** Légende:




Chemin:
Bateau:

transport par chemin, surtout incompatibles (par exemple 'pièces mécanique, HMS')
transport par bateau, fer haute qualité (par exemple 'E3')

Sujets supplémentaires

Au bord du site

- Dernière bateau chargée:
 - 19 mars
- Prochain bateau prévu:
 - 14 mai

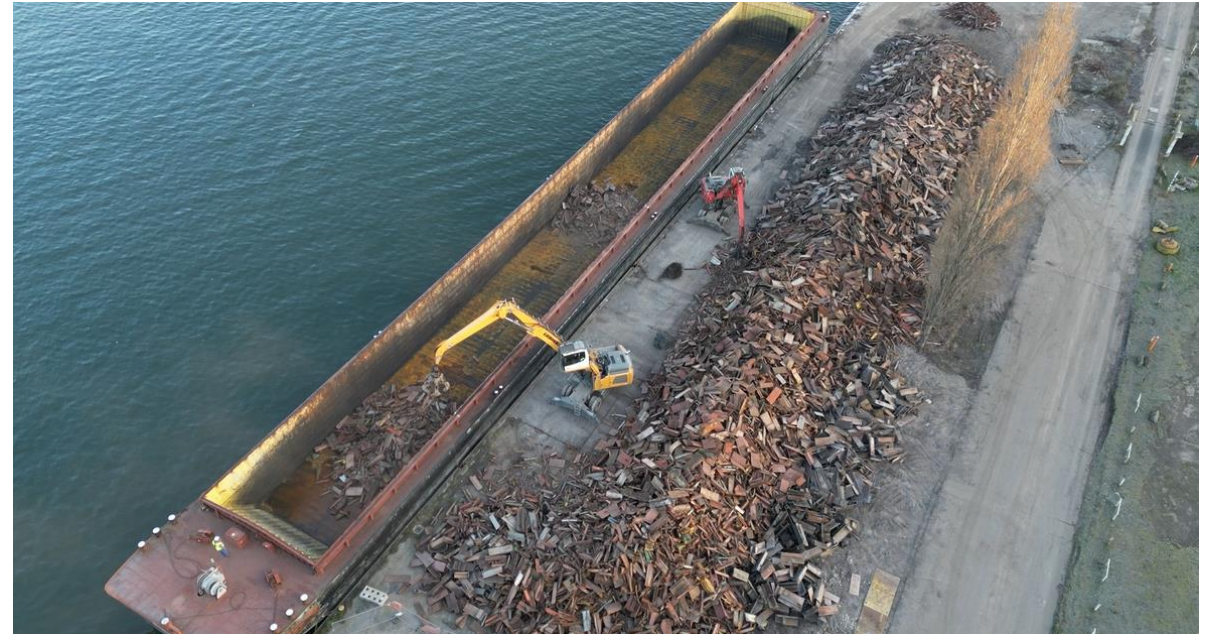

Varia

- Les pressions sur les manomètres des ballons utilisé pour bloquer les égouts sont restées constantes et se situent dans les limites prescrites (entre 1 et 1,2 bar).

Rapportage des plaintes/remarques
(quid des exercices militaires ?)

Rappel



- Contact chantier

- Numéro accessible de 9 à 16 H
- Boite mail
- En dehors des heures

0476 302650

contact@sdchertal.be

Répondeur et numéro d'urgence


- Plateforme Internet

- www.sdchertal.be

- Personnes de contact

- Jacques Roland - Gestionnaire chantier
- Sabine Huc – Communication
- Kris Martens – Directeur Général
- Ir. Karel Lambie – Adjoint au Directeur Général

Contacts riverains

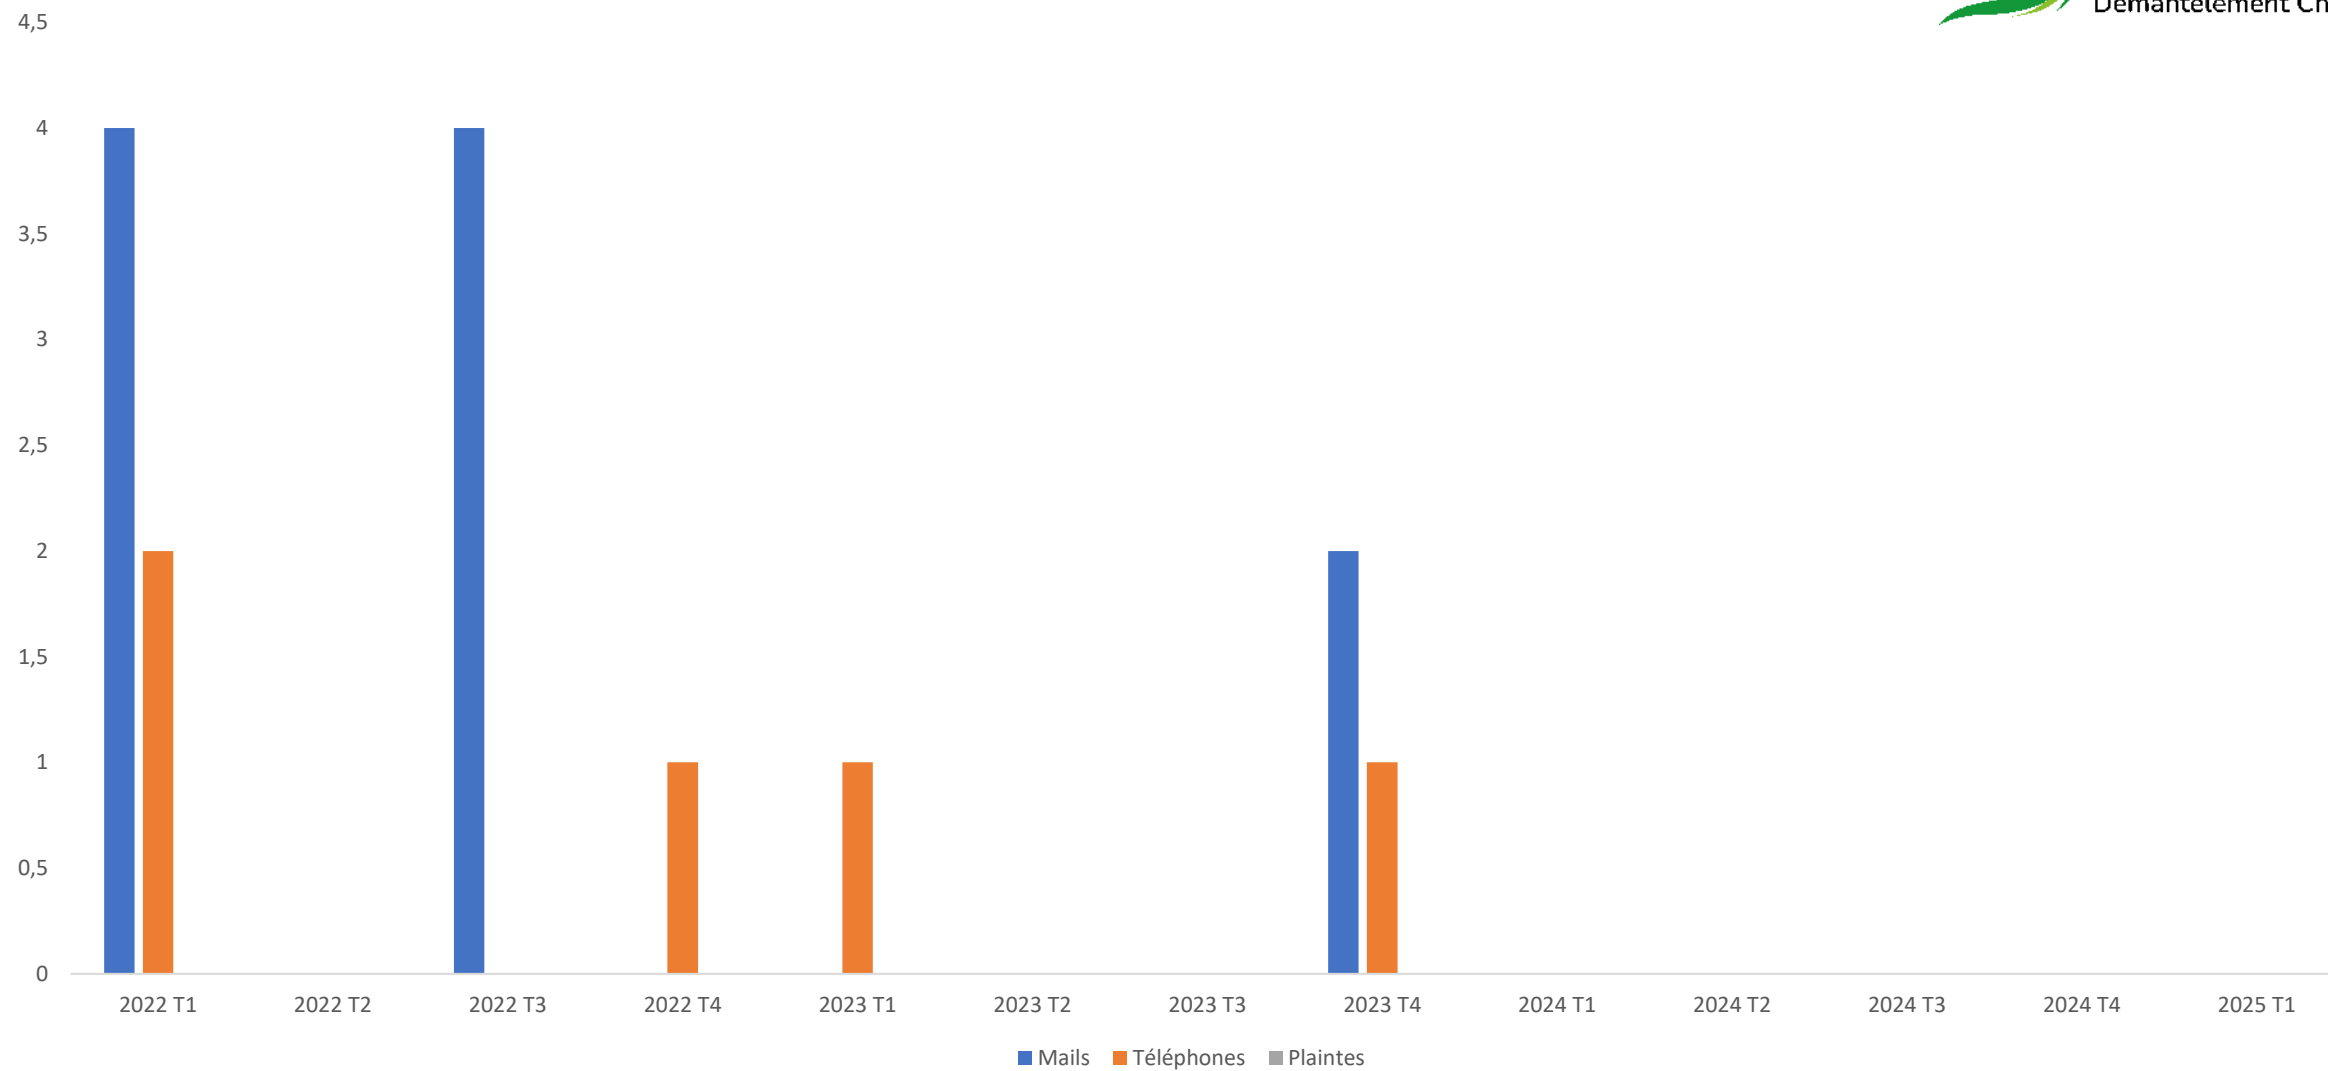

Exercices militaires



Mail adressé au Comité d'accompagnement le 13 janvier 2025

Ce 7 janvier 2025, une réunion s'est tenue au Cabinet du Bourgmestre d'Oupeye, en présence des autorités communales, du Commandement Militaire de la Province de Liège, de Wallonie Entreprendre et de SDC. Cette coordination avait pour but d'améliorer la concertation entre les différents acteurs dans le cadre des exercices militaires et de réduire au maximum les nuisances.

- Les exercices, sans utilisation d'explosif, auront toujours lieu sur l'entièreté du site.
- Les explosions au nord du site ne pourront avoir lieu qu'entre 9h et 12h. Au sud du site, les explosions seront autorisées de 8h à 16h. Une interruption des exercices technique aura lieu entre 13 et 14h.
- SDC et la Défense continueront d'établir des analyses de risques qui seront toujours précédées d'une reconnaissance commune.
- Comme auparavant, il n'y aura des tirs à blanc qu'entre 7h30 et 17h.
- La Défense continuera à communiquer les éléments d'information vers les différentes autorités de la façon la plus complète possible (Gouverneur, Bourgmestres, polices locales et fédérale). SDC se chargera de se faire le relais vers les membres du Comité d'Accompagnement.
- La Défense veillera à communiquer afin de sensibiliser la population au fait que l'ancien site métallurgique de CHERTAL contribue grandement à l'opérationnalité des militaires belges dans des domaines bien spécifiques afin de pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens.

OUPEYE

Des exercices militaires réalisés sur le site de Chertal

Le site de Chertal accueillera des exercices militaires dès ce 21 janvier, mais des mesures ont été prises pour éviter au maximum les nuisances.

Ce mardi 21 janvier entre 8 et 16 heures, des bruits d'explosion pourraient être entendus sur le site de Chertal. Des exercices militaires vont

en effet être réalisés par le commandement militaire de la province de Liège. Mais cette fois-ci, les bruits pourraient être plus contenus. Suite aux plaintes de certains citoyens, la commune d'Oupeye a organisé une réunion en présence de la Défense et de la société en charge du démantèlement de Chertal afin




Des militaires vont investir le site de Chertal. © Sudinfo


de réduire au maximum les nuisances sonores. Ainsi, les explosions au nord du site ne pourront avoir lieu qu'entre 9 et 12h. Au sud, elles seront autorisées entre 8 et 16h. Les exercices seront interrompus entre 13 et 14h et les tirs à blanc seront privilégiés entre 7h30 et 17h. ■

Planning et perspectives

Planification TLB

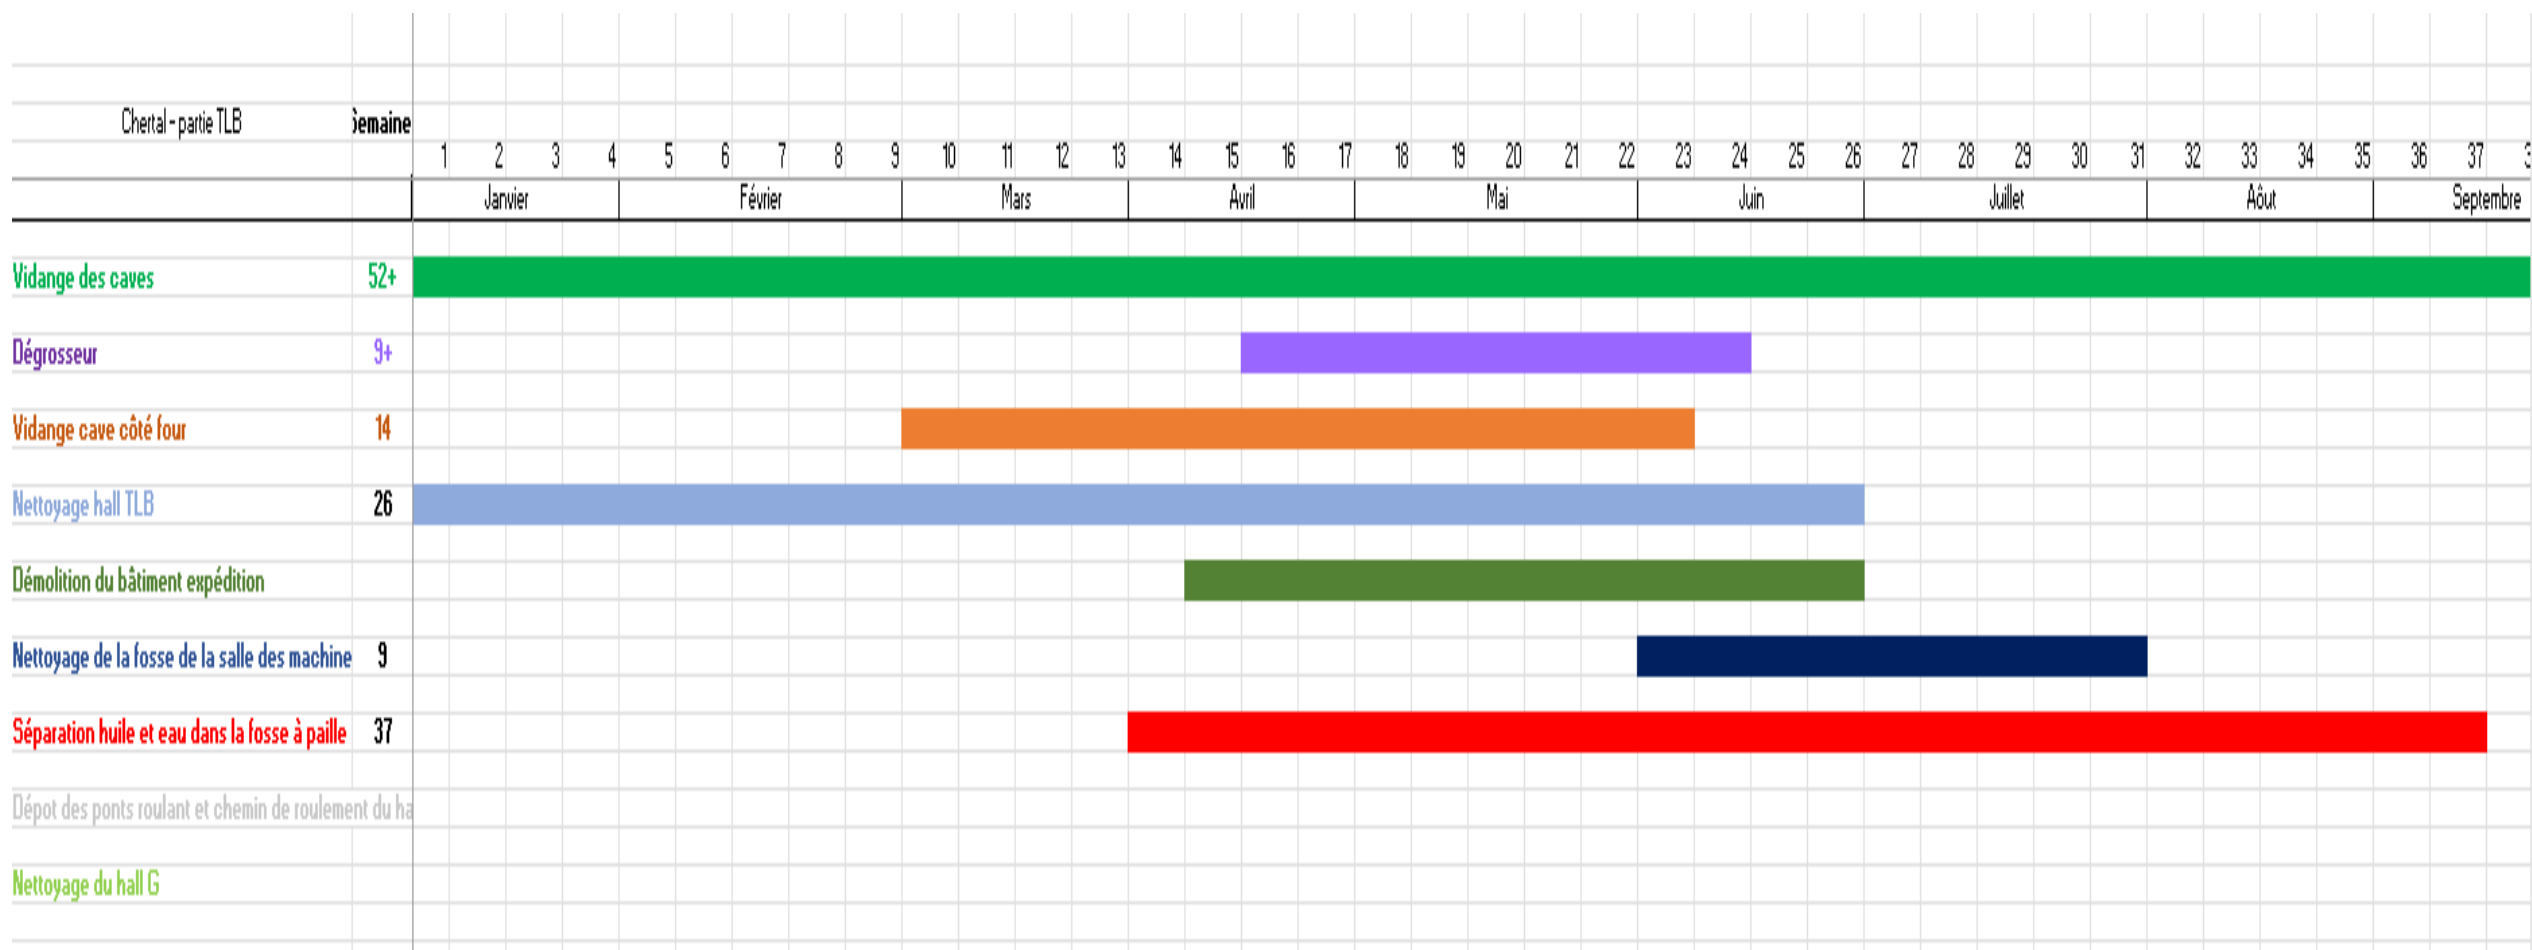

Planification ACC

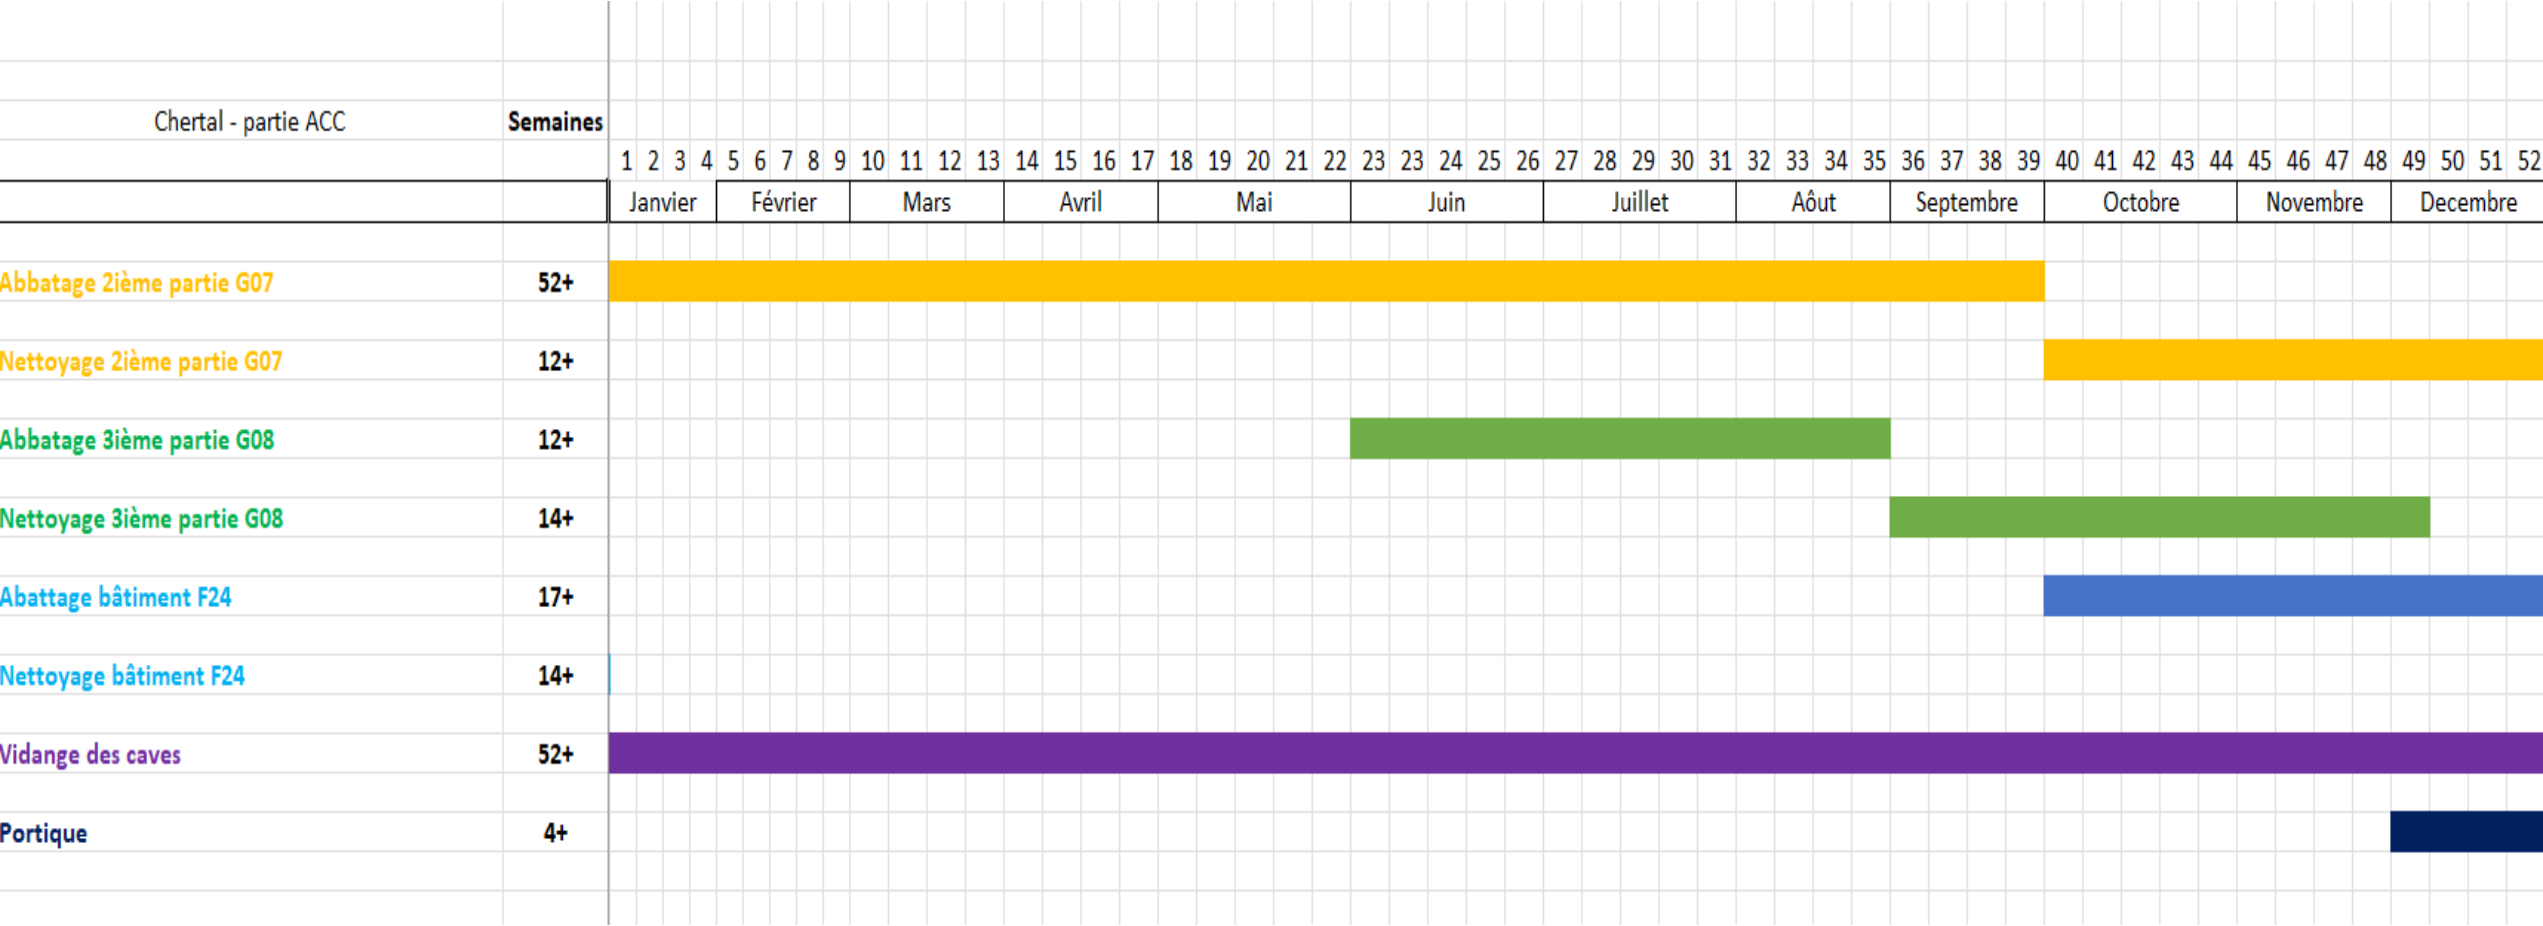

Divers



Merci pour votre attention

Information riverains

www.sdchertal.be

contact@sdchertal.be

+32 (0) 476 30 26 50

(accessible de 9 à 16 heures)

